



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tenosique de Pino Suárez  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
FAMO 33 FONDO III 2015  
K005.- JRBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion  
Ora por Contrato

FECHA: 9 SEPTIEMBRE 2015  
D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP070.- REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE FLORES  
MAGON ( COL. LUIS DONALDO COLOSIO)

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 951.20

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 10 DE AGOSTO DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 30 DE AGOSTO DEL 2015

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

RFC: LCO1205247C2

DOMICILIO: JOSE MARTI 101, DEPTO 104, LIDIA ESTHER MONICA DE PORTILLA, VILLAHERMOSA, TABASCO C.P. 86040

CONTRATO: CO-OP067A/LOP072-27/2015

IMPORTE: \$337,472.44

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 16 DE JULIO DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 10 DE AGOSTO DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 30 DE AGOSTO DEL 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
 RAMO 33 FONDO III 2015  
 K005.- URBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion  
 Obra por Contrato

**GARANTIAS**

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 1923724 IMPORTE: \$33,747.24 FECHA DE EXP: 27 JULIO 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 1923723 IMPORTE: \$131,241.73 FECHA DE EXP: 27 JULIO 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 1956870 IMPORTE: \$32,268.75 FECHA DE EXP: 09 SEPTIEMBRE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 10 DE AGOSTO DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 30 DE AGOSTO DEL 2015

**OBJETO**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCÓ EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 0.81 mts x 1.22 mts. A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR. DE 2" GALVANIZADO CAL. 6. SE REALIZO TRABAJOS DE DEMOLICION DE PAVIEMNTO ASFALTICO EXISTENTE EN MAL ESTADO, PARA SU POSTERIOS RETIRO FUERA DE LA OBRA, SE REALIZO EL ESCARIFICADO DE BASE

*[Handwritten signature]*



DELEGADO MUNICIPAL  
 DR. LUIS DONALDO COLLA  
 Hoja 2 de 5



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
 RAMO 33 FONDO III 2015  
 E005.- URBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion  
 Obra por Contrato

HIDRAULICA EXISTEN EN UN ESPESOR DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO Y PAFA SU POSTERIOR TENDIDO Y RECOMPACTADO Y REPARACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS, SE REALIZO TRABAJOS DE BACHEO ASFALTICO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM, ASI COMO EL TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM. CON MAQUINARIA PESADA SE REALIZO EL SELLADO DE TODA LA CALLE CON SELLO Premezclado SELLO TIPO 3A COMO ACABADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LA MEJORA DE Y MAYOR ADHERENCIA DE LA SUPEFICIE.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 838.40

POBLACION BENEFICIADA: 715 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001 - CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO ACTA COPLADEMUN No.	FECHA	INVERSION (\$)
	<u>No. 01-06/2015</u>	<u>\$ 352,304.90</u>

**MODIFICACIONES** (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

**INVERCION EJERCIDA**

No ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	25 DE AGOSTO DE 2015	10 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015	\$266,564.18	
2 (DOS) TRABAJO EJECUTADOS FINIQUITO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2015	21 AL 30 DE AGOSTO DE 2015	\$56,123.68	





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
**RAMO 33 FONDO III 2015**  
**K005.- URBANIZACION**



**Acta De entrega - Recepcion**  
**Obra por Contrato**

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	<u>\$337,472.44</u>	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	<u>\$322,687.86</u>
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):			
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	<u>\$103,188.97</u>	SALDO POR CANCELAR :	<u>\$14,784.58</u>

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAFEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. JORGE LUIS MBRIZ ERUZ

**RECIBE**

INTERVIENEN EN EL ACTO  
 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIA Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: C. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO RAMO 33

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINERMAN PEREZ ARCOS





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
 RAMO 33 FONDO III 2015  
 K005.- URBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion  
 Odra por Contrato

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

ENTREGA - RECEPCION

RECIBE

COMITÉ ( X )

DEPENDENCIA ( )

POR EL COMITÉ COMUNITARIO ( RECIBE DE CONFORMIDAD)

PRESIDENTE

  
 FRANCISCO MONTIJOYA CRUZ

SECRETARIO

  
 ELENA LANDERO MOSQUEDA

TESORERO

  
 A. SELEN LANDERO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


  
 MARIA DEL CARMEN PEREZ SANCHEZ

SEGUNDO VOCAL

  
 MIRNA DEL CARMEN CRUZ PEREZ

TERCER VOCAL

  
 BELLA LIZ GARCIA HERNANDEZ

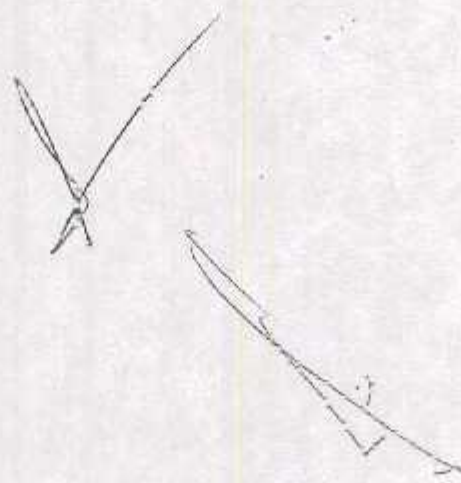

ALCALDE MUNICIPAL  
 M. LUIS DONALDO COLLA  
 TENOSIQUE, TABASCO
