



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 2016



TENOSIQUE

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 28 NOVIEMBRE 2016
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP067.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20, ENTRE CALLE 45 Y CALLE 37, COLONIA PUEBLO NUEVO.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ.

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO GENERAL 33 FONDO III 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 93.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 03 DE OCTUBRE DEL 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: AACORS SOLUCION S. DE R.L. DE C.V.

RFC: ASO151030ISO

DOMICILIO: CARRETERA VILLAHERMOSA A TEAPA KM. 18 COL. EL MANZANO CENTRO TABASCO

CONTRATO: CO-OP067-16/2016

IMPORTE: \$ 340,690.24

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 03 DE OCTUBRE DEL 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016



COORDINACIÓN DE
DELEGADOS
TRIENIO 2016-2018

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 16A28111 IMPORTE: \$34,069.02 FECHA DE EXP: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 16A28107 IMPORTE: \$102,207.07 FECHA DE EXP: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA S.A.

FIANZA No.: 16A42681 IMPORTE: \$28,834.32 FECHA DE EXP: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA S.A. VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 03 DE OCTUBRE DEL 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:


EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZO TRAZO Y NIVELACION CON ESTACION TOTAL PARA DETERMINAR NIVELES DE PROYECTO, EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBERIA PARA LINEA DE DRENAJE SANITARIO AL IGUAL QUE SUS DESCARGAS DOMICILIARIAS CON REGISTRO, CORTE DE TERRAPLEN CON MOTOCONFORMADORA PARA RECIBIR BASE, COLADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C:250 CM2, CON MALLA ELECTROSOLDADA.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 77.40

COORDINACIÓN DE
DELEGADOS

POBLACION BENEFICIADA: 32,579 PERSONAS

LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001-CD TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ.

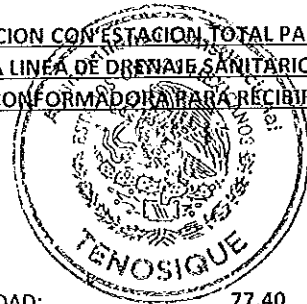

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
ADECUACION PRESUPUESTAL NUM.		

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERCION EJERCIDA

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 231,566.29	\$ 70,867.27
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 01 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$ 56,776.95	\$ 33,079.80



IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	<u>\$340,690.24</u>	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	<u>\$288,343.24</u>
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	<u>\$52,347.00</u>	COORDINACIÓN DE DELEGADOS	
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	<u>\$103,947.07</u>	SALDO POR CANCELAR: <u>\$52,347.00</u>	
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):	<u>\$52,347.00</u>		

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: AACORS SOLUCION S. DE R.L. DE C.V.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. CARLOS SEBASTIAN HERNANDEZ CRUZ.

RECIBE COMITÉ () DEPENDENCIA (X)

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: COORDINADOR GENERAL RAMO 33

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA



COORDINACIÓN DE
DELEGADOS
TRIENIO 2016-2018

**CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO**
